	Kód	Tevékenységnév	Idő	Kezdés	Befejezés
1	2014/15	Gödöllő Látogatóközpont	124n	2016.02.15.	2016.08.09.
2	1.0	Munkaterület előkészítése	14n	2016.02.15.	2016.03.03.
3	1.1	Tereprendezés	7n	2016.02.15.	2016.02.23.
4	1.1.1	Munkaterület átadás-átvétel	0n	2016.02.15.	2016.02.15.
5	1.1.2	Telekhatár kitűzés, bozótírtás	1n	2016.02.15.	2016.02.15.
6	1.1.3	Ideiglenes kerítés építése	2n	2016.02.16.	2016.02.17.
7	1.1.4	Humusz leszedés, elszállítása	1n	2016.02.18.	2016.02.18.
8	1.1.5	Munkagödör földkiemelése, elszállítás	1n	2016.02.19.	2016.02.19.
9	1.1.6	Ideiglenes utak kiépítése	3n	2016.02.19.	2016.02.23.
10	1.2	Ideiglenes berendezések	7n	2016.02.24.	2016.03.03.
11	1.2.1	Konténerek telepítése	1n	2016.02.24.	2016.02.24.
12	1.2.2	Vízóra akna építése	2n	2016.02.24.	2016.02.25.
13	1.2.3	Ideiglenes villanyoszlopok világítással	4n	2016.02.25.	2016.03.01.
14	1.2.4	Szabadvezeték szerelése	1n	2016.03.02.	2016.03.02.
15	1.2.5	Elektromos szekrény kialakítás	1n	2016.03.03.	2016.03.03.
16	2.0	Betonozás	22n	2016.02.26.	2016.03.30.
17	2.1	Pontalapok kialakítása	15n	2016.02.26.	2016.03.18.
18	2.1.1	Szerelőbeton készítése	2n	2016.02.26.	2016.02.29.
19	2.1.2	Alaptest vasalása	1n	2016.03.03.	2016.03.03.
20	2.1.3	Alaptest zsaluzása	1n	2016.03.04.	2016.03.04.
21	2.1.4	Betonozás szivattyús technológiával	1n	2016.03.07.	2016.03.07.
22	2.1.5	Pontalap vasalása	1n	2016.03.10.	2016.03.10.
23	2.1.6	Pontalap zsaluzása	1n	2016.03.11.	2016.03.11.
24	2.1.7	Betonozás szivattyús technológiával	1n	2016.03.14.	2016.03.14.
25	2.1.8	Kizsaluzás	1n	2016.03.18.	2016.03.18.
26	2.2	Talpgerenda	12n	2016.03.11.	2016.03.30.
27	2.2.1	Talpgerenda vasalása	1n	2016.03.11.	2016.03.11.
28	2.2.2	Talpgerenda zsaluzása	1n	2016.03.21.	2016.03.21.
29	2.2.3	Betonozás szivattyús technológiával	1n	2016.03.22.	2016.03.22.
30	2.2.4	Kizsaluzás	1n	2016.03.29.	2016.03.29.
31	2.2.5	Földfeltöltés, tömörítéssel	1n	2016.03.30.	2016.03.30.
32	3.0	Szerkezetépítés	5n	2016.03.30.	2016.04.05.
33	3.1	Tartószerkezet építés	5n	2016.03.30.	2016.04.05.
34	3.1.1	IPE tartók szerelése I-VII. jelű	1n	2016.03.30.	2016.03.30.
35	3.1.2	Trapézlemez merevítés építés	4n	2016.03.31.	2016.04.05.
36	3.1.4	IPE tartók, trapézlemez elhelyezése	5n	2016.03.30.	2016.04.05.
37	4.0	Építőmesteri munkák	21n	2016.04.06.	2016.05.04.
38	4.1	Magastető kialakítása	21n	2016.04.06.	2016.05.04.
39	4.1.2	Magastató Z szelemenjeinek szerelése	12n	2016.04.06.	2016.04.21.
40	4.1.3	Magastető hőszigetelése	10n	2016.04.12.	2016.04.25.
41	4.1.4	Magastető trapézlemez fedése	15n	2016.04.13.	2016.05.03.
42	4.1.5	Függő ereszcsatorna szerelése	1n	2016.05.04.	2016.05.04.
43	4.1.6	Kosaras emelő	21n	2016.04.06.	2016.05.04.
44	5.0	Szakipari munkák	67n	2016.04.06.	2016.07.08.
45	5.1	INFOTÉR ÉPÜLETE	65n	2016.04.06.	2016.07.06.
46	5.1.1	Lemezalap építése	12n	2016.04.06.	2016.04.21.
47	5.1.1.1	INF. Kavicsterítés, tömörítéssel	1n	2016.04.06.	2016.04.06.
48	5.1.1.2	INF. XPS hősziegetelés fektetése	1n	2016.04.07.	2016.04.07.
49	5.1.1.3	INF. Vasbeton lemezalap zsaluzása	1n	2016.04.08.	2016.04.08.
50	5.1.1.4	INF. Vasbeton lemezalap vasalása	1n	2016.04.11.	2016.04.11.
51	5.1.1.5	INF. Betonozás szivattyús technológiával	1n	2016.04.12.	2016.04.12.
52	5.1.1.6	INF. Kizsaluzás	1n	2016.04.19.	2016.04.19.
53	5.1.1.7	INF. Bit. talajnedvesség elleni szigetelés	2n	2016.04.20.	2016.04.21.
54	5.1.2	Homlokzatok, válaszfalak	15n	2016.04.22.	2016.05.12.
55	5.1.2.1	INF. Szerelt homlokzat szerelése	3n	2016.04.22.	2016.04.26.
56	5.1.2.2	INF. Homlokzat hőszigetelése	3n	2016.04.25.	2016.04.27.
57	5.1.2.3	INF. Homlokzati falkazetták elhelyezése	3n	2016.05.02.	2016.05.04.
58	5.1.2.4	INF. Homlokzati ajtók elhelyezése	1n	2016.05.05.	2016.05.05.
59	5.1.2.5	Kosaras emelő használat	10n	2016.04.22.	2016.05.05.
60	5.1.2.6	INF. Függönyfal szerelés	2n	2016.05.02.	2016.05.03.
61	5.1.2.7	INF. Gipszkarton válaszfal építés	6n	2016.05.05.	2016.05.12.
62	5.1.3	Épületgépészeti munkák	7n	2016.05.05.	2016.05.13.
63	5.1.3.1	INF. Szellőztetőberendezés kiépítése	2n	2016.05.12.	2016.05.13.
64	5.1.3.2	INF. Vízvezeték és szennyvízszerelés	4n	2016.05.10.	2016.05.13.
65	5.1.3.3	INF. Fűtésszerelés	3n	2016.05.05.	2016.05.09.
66	5.1.3.4	INF. Nyomáspróba	3n	2016.05.10.	2016.05.12.
67	5.1.3.5	INF. Elektromos redszer kiépítése	1n	2016.05.13.	2016.05.13.
68	5.1.4	Aljzat, burkolat kialakítás	32n	2016.05.17.	2016.06.29.
69	5.1.4.1	INF. Lépésálló EPS hőszig. fektetése	2n	2016.05.17.	2016.05.18.
70	5.1.4.2	INF. Aljazbeton készítése	2n	2016.05.19.	2016.05.20.
71	5.1.4.3	INF. Gipszkarton borítás	9n	2016.05.23.	2016.06.02.
72	5.1.4.4	INF. PE fólia elhelyezése	5n	2016.05.30.	2016.06.03.
73	5.1.4.5	INF. Gipszkarton borítás	9n	2016.05.31.	2016.06.10.
74	5.1.4.6	INF. Gipszkarton álmennyezet	2n	2016.06.13.	2016.06.14.
75	5.1.4.7	INF. Hidegburkolat	2n	2016.06.15.	2016.06.16.
76	5.1.4.8	INF. Epoxigyanta burkolat	1n	2016.06.15.	2016.06.15.
77	5.1.4.9	INF. Polírbeton felület	4n	2016.06.10.	2016.06.15.
78	5.1.4.10	INF. Beltéri ajtók	1n	2016.06.24.	2016.06.24.
79	5.1.4.11	INF. Üzemi vízszigetelés	1n	2016.06.27.	2016.06.27.
80	5.1.4.12	INF. Vízesblokkok falainak burkolása	2n	2016.06.28.	2016.06.29.
81	5.1.4.13	INF. Belső felületek tapétázása	2n	2016.06.27.	2016.06.28.
82	5.1.4.14	INF. Melegburkolat	1n	2016.06.29.	2016.06.29.
83	5.1.5	Szerelvények kiépítése, bútorozás	5n	2016.06.30.	2016.07.06.
84	5.1.5.1	INF. Fűtésszerelés szerelvényei	1n	2016.06.30.	2016.06.30.
85	5.1.5.2	INF. Víz- szennyvízvezeték szerelvényei	1n	2016.06.30.	2016.06.30.
86	5.1.5.3	INF. Elektromos rendszer szerelvényei	2n	2016.06.30.	2016.07.01.
87	5.1.5.4	INF. Szellőzőrendszer szerelvényei	2n	2016.07.01.	2016.07.04.
88	5.1.5.5	INF. Belső lakatos munkák	1n	2016.06.30.	2016.06.30.
89	5.1.5.6	INF. Beépített bútorok kiépítése	2n	2016.07.05.	2016.07.06.
90	5.2	KÁVÉZÓ ÉPÜLETE	66n	2016.04.07.	2016.07.08.
91	5.2.1	Lemezalap építése	13n	2016.04.07.	2016.04.25.
92	5.2.1.1	KÁV. Kavicsterítés, tömörítéssel	1n	2016.04.07.	2016.04.07.
93	5.2.1.2	KÁV. XPS hősziegetelés fektetése	1n	2016.04.08.	2016.04.08.
94	5.2.1.3	KÁV. Vasbeton lemezalap zsaluzása	1n	2016.04.11.	2016.04.11.
95	5.2.1.4	KÁV. Vasbeton lemezalap vasalása	1n	2016.04.12.	2016.04.12.
96	5.2.1.5	KÁV. Betonozás szivattyús technológiával	1n	2016.04.13.	2016.04.13.
97	5.2.1.6	KÁV. Kizsaluzás	1n	2016.04.20.	2016.04.20.
98	5.2.1.7	KÁV. Bit. talajnedvesség elleni szigetelés	3n	2016.04.21.	2016.04.25.
99	5.2.2	Homlokzatok, válaszfalak	19n	2016.04.27.	2016.05.24.
100	5.2.2.1	KÁV. Szerelt homlokzat szerelése	2n	2016.04.27.	2016.04.28.
101	5.2.2.2	KÁV. Homlokzat hőszigetelése	2n	2016.04.28.	2016.04.29.
102	5.2.2.3	KÁV. Homlokzati falkazetták elhelyezése	2n	2016.05.05.	2016.05.06.
103	5.2.2.4	KÁV. Homlokzati ajtók elhelyezése	1n	2016.05.09.	2016.05.09.
104	5.2.2.5	Kosaras emelő használat	8n	2016.04.28.	2016.05.09.
105	5.2.2.6	KÁV. Függönyfal szerelés	2n	2016.05.02.	2016.05.03.
106	5.2.2.7	KÁV. Gipszkarton válaszfal építés	7n	2016.05.13.	2016.05.24.
107	5.2.3	Épületgépészeti munkák	8n	2016.05.13.	2016.05.25.
108	5.2.3.1	KÁV. Szellőztetőberendezés kiépítése	2n	2016.05.17.	2016.05.18.
109	5.2.3.2	KÁV. Vízvezeték és szennyvízszerelés	3n	2016.05.20.	2016.05.24.
110	5.2.3.3	KÁV. Fűtésszerelés	3n	2016.05.13.	2016.05.18.
111	5.2.3.4	KÁV. Nyomáspróba	3n	2016.05.19.	2016.05.23.
112	5.2.3.5	KÁV. Elektromos redszer kiépítése	1n	2016.05.25.	2016.05.25.
113	5.2.4	Aljzat, burkolat kialakítás	27n	2016.05.26.	2016.07.01.
114	5.2.4.1	KÁV. Lépésálló EPS hőszig. fektetése	2n	2016.05.26.	2016.05.27.
115	5.2.4.2	KÁV. Aljazbeton készítése	2n	2016.05.30.	2016.05.31.
116	5.2.4.3	KÁV. Gipszkarton borítás	4n	2016.06.01.	2016.06.06.
117	5.2.4.4	KÁV. PE fólia elhelyezése	4n	2016.06.02.	2016.06.07.
118	5.2.4.5	KÁV. Gipszkarton borítás	4n	2016.06.03.	2016.06.08.
119	5.2.4.6	KÁV. Gipszkarton álmennyezet	3n	2016.06.09.	2016.06.13.
120	5.2.4.7	KÁV. Hidegburkolat	2n	2016.06.14.	2016.06.15.
121	5.2.4.8	KÁV. Epoxigyanta burkolat	1n	2016.06.14.	2016.06.14.
122	5.2.4.9	KÁV. Kőmozaik burkolat	4n	2016.06.09.	2016.06.14.
123	5.2.4.10	KÁV. Beltéri ajtók	1n	2016.06.23.	2016.06.23.
124	5.2.4.11	KÁV. Üzemi vízszigetelés	2n	2016.06.24.	2016.06.27.
125	5.2.4.12	KÁV. Vízesblokkok falainak burkolása	4n	2016.06.28.	2016.07.01.
126	5.2.4.13	KÁV. Belső felületek tapétázása	2n	2016.06.24.	2016.06.27.
127	5.2.5	Szerelvények kiépítése, bútorozás	6n	2016.07.01.	2016.07.08.
128	5.2.5.1	KÁV. Fűtésszerelés szerelvényei	1n	2016.07.01.	2016.07.01.
129	5.2.5.2	KÁV. Víz-szennyvízvezeték szerelvényei	1n	2016.07.04.	2016.07.04.
130	5.2.5.3	KÁV. Elektromos rendszer szerelvényei	2n	2016.07.05.	2016.07.06.
131	5.2.5.4	KÁV. Szellőzőrendszer szerelvényei	2n	2016.07.05.	2016.07.06.
132	5.2.5.5	KÁV. Belső lakatos munkák	1n	2016.07.07.	2016.07.07.
133	5.2.5.6	KÁV. Beépített bútorok kiépítése	2n	2016.07.07.	2016.07.08.
134	5.3	Épület körüli járda és lábazat	8n	2016.07.11.	2016.07.20.
135	5.3.1	Kavicsterítés, tömörítéssel	1n	2016.07.11.	2016.07.11.
136	5.3.2	Járda betonozás	4n	2016.07.12.	2016.07.15.
137	5.3.3	Lábazati vakolat készítés	3n	2016.07.18.	2016.07.20.
138	6.0	Telekrendezés	10n	2016.07.21.	2016.08.03.
139	6.1	Ideiglenes szerkezetek bontása	3n	2016.07.21.	2016.07.25.
140	6.2	Viacolor burklat lerakása	5n	2016.07.22.	2016.07.28.
141	6.3	Humuszterítés	1n	2016.07.29.	2016.07.29.
142	6.4	Füvesítés	3n	2016.08.01.	2016.08.03.
143	7.0	Épület átadás-átvétel	4n	2016.08.04.	2016.08.09.
144	7.1	Takarítás	4n	2016.08.04.	2016.08.09.
145	7.2	Műszaki átadás-átvétel	0n	2016.08.09.	2016.08.09.

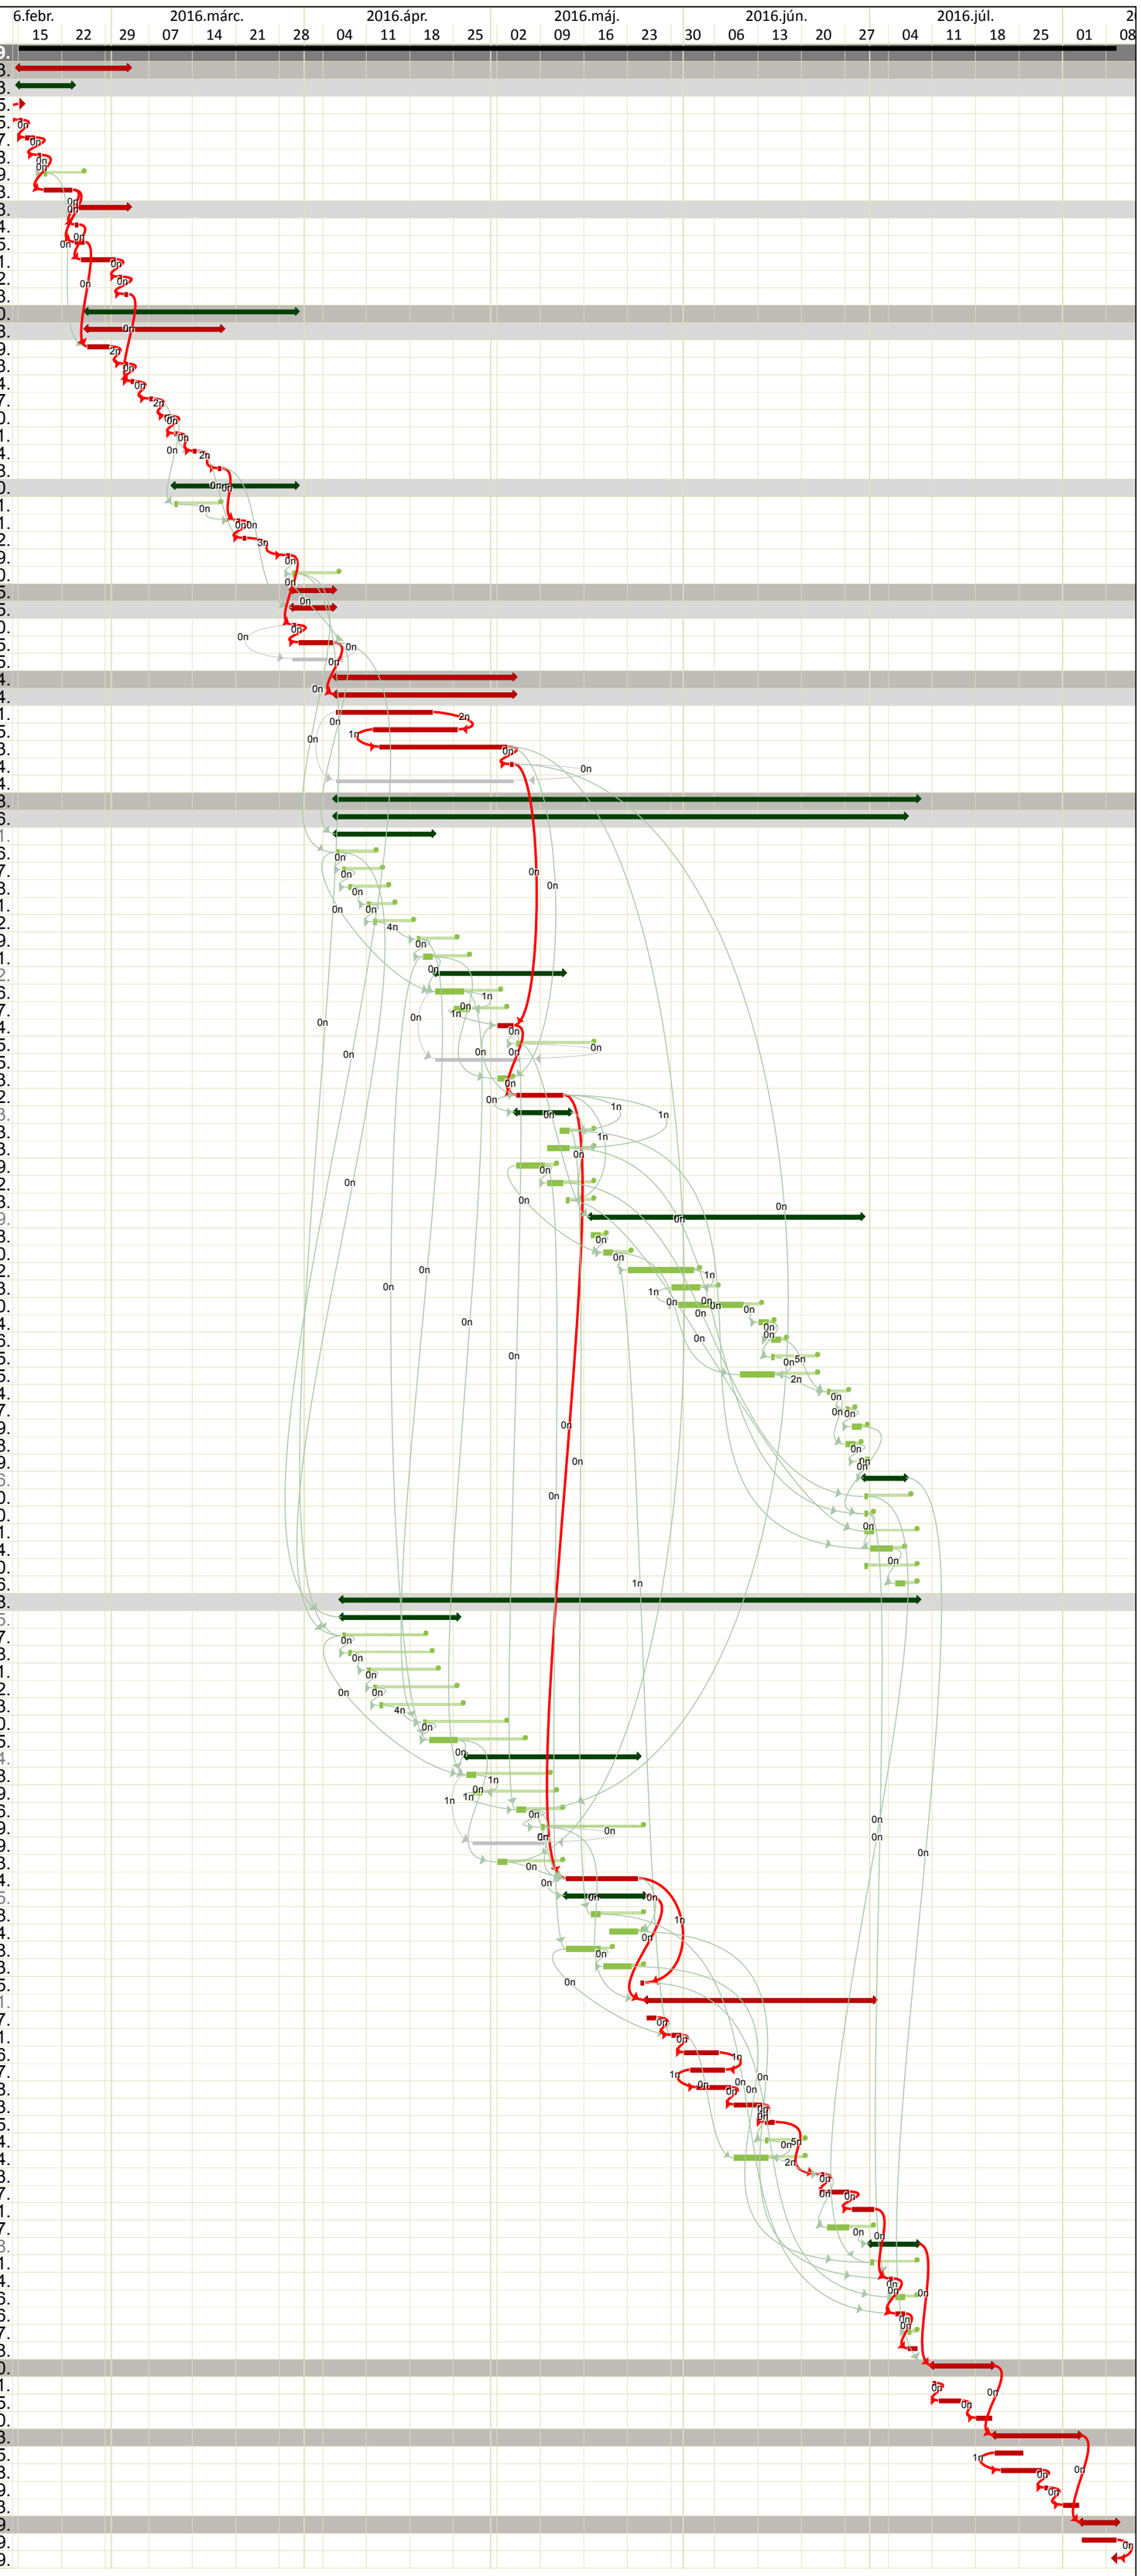

Projekt | Összegző kritikus | Összegző nem kritikus | Normál kritikus | Normál nem kritikus
Befüggesztett | Rendelkezésre álló idősáv | Kezdés mérföldkő kritikus | Befejezés mérföldkő kritikus
